


海側遮水壁設置工事の概要について

【工事進捗概要図】

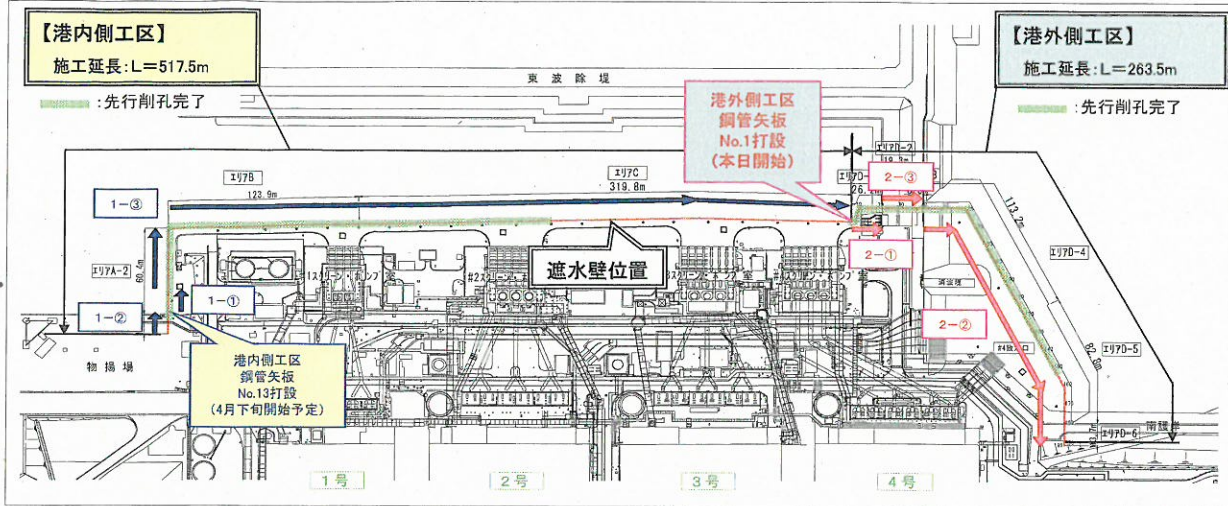

【港内側工区】

工種	数量	予定進捗度(4/1時点)	作業期間
先行削孔	403本	63.5%(256本完了)	H24.6月末～H25.8月末
鋼管矢板打設	404本	4月下旬 No.13打設開始予定	H25.4月下旬～H26.4月末

《鋼管矢板打設順》
 1-① : No.13→No.24 海上施工
 1-② : No.1→No.12 陸上施工
 1-③ : No.25→No.404 海上施工

【港外側工区】


工種	数量	予定進捗度(4/1時点)	作業期間
先行削孔	192本	83.9%(161本完了)	H24.6月末～H25.5月末
鋼管矢板打設	191本	4/2(火) No.1打設開始	H25.4月～H25.10月初

《鋼管矢板打設順》
 2-① : No.1→No.23
 2-② : No.39→No.191
 2-③ : No.24→No.38

1

・本日(4/2)、港外側工区の南防波堤周辺エリアで、1本目の鋼管矢板のバイプロハンマ打設を実施。

【鋼管矢板打設フロー】

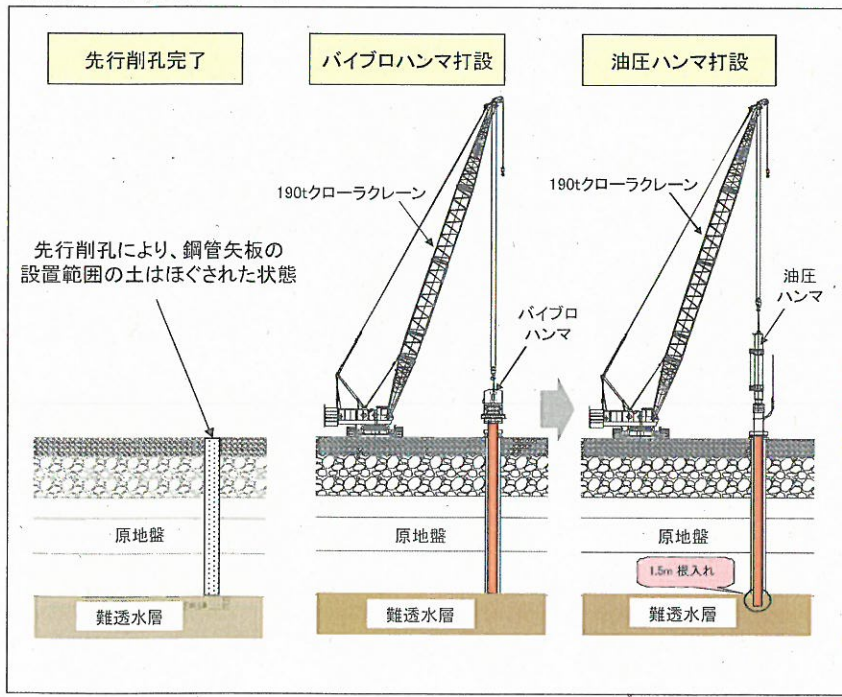

【作業状況写真】



【撮影日】平成25年4月2日
 【提供】東京電力株式会社

2
