

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日  
令和2年2月13日（木）
- 2 確認箇所  
2号機タービン建屋東側等
- 3 確認項目  
1 / 2号機共用排気筒の解体ブロックの仮置き状況

### 4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒の解体工事については、2月4日に11ブロック目まで解体が完了し、解体されたブロックは2号機タービン建屋東側のヤード等に仮置きされている。

本日は解体ブロックの仮置き状況の確認を行った。

- ・ 2号機タービン建屋東側のヤードには解体された主柱及び斜材（以下、「主柱等」という。）が仮置きされており、主柱等の切断に使用する重機も仮置きされていた。（図1、写真1）
- ・ 筒身はシート養生し架台に固定された状態で、2.5m盤に仮置きされていた。（図1、写真2）
- ・ 東京電力によると、主柱等は切断用アタッチメントを取り付けた重機及び溶断で切断後、コンテナに収納して保管場所へ移送し、保管は野積みでシート掛けをするとのことであった。（写真3）

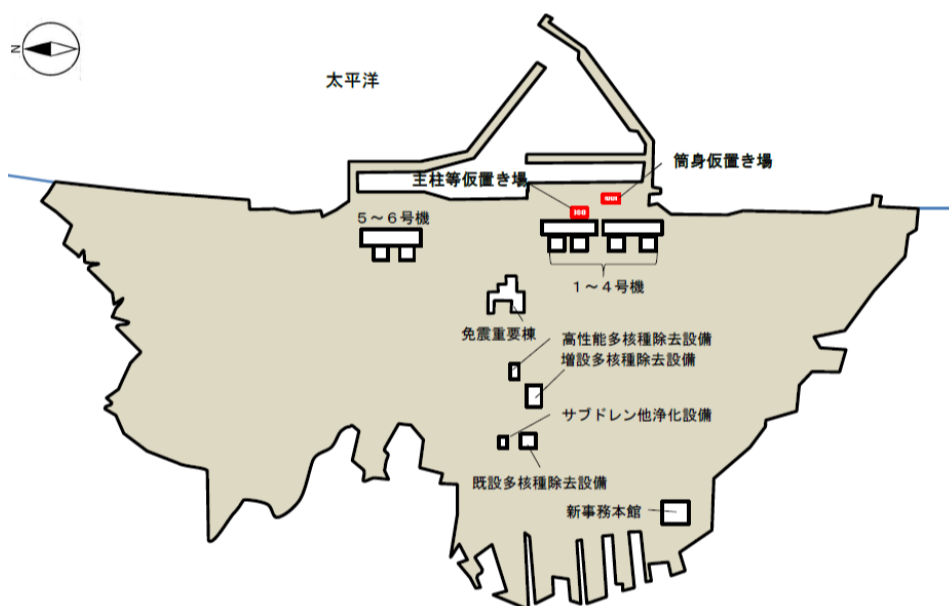

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図

切断に使用する重機



(写真1)  
南西側から撮影



(写真2)  
北東側から撮影



(写真3)  
コンテナボックスの仮置き状況  
当該コンテナボックスに切断した主  
柱等を収納し、野積み保管場所へ移送  
する

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
