

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和2年 3月30日 (月)
- 2 確認箇所  
メガフロート (1～4号機取水路開渠内)
- 3 確認項目  
メガフロート津波等リスク低減対策工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

メガフロート津波等リスク低減対策工事は、3月4日からステップ2としてメガフロートの着底・内部充填作業が開始されており、3月5日には、1～4号機取水路開渠北側(図1)の着底マウンドにメガフロートを仮着底させる作業の状況を確認している。今回は、その後の進捗状況を確認した。

- ・メガフロートの内部にモルタルを充填する作業は、まだ開始されておらず、工事用車両がメガフロートに進入するための仮栈橋を設置する作業が行われていた。(写真1)
- ・メガフロート北側の港湾内では、汚濁防止フェンスを設置する作業が行われていた。(写真2)

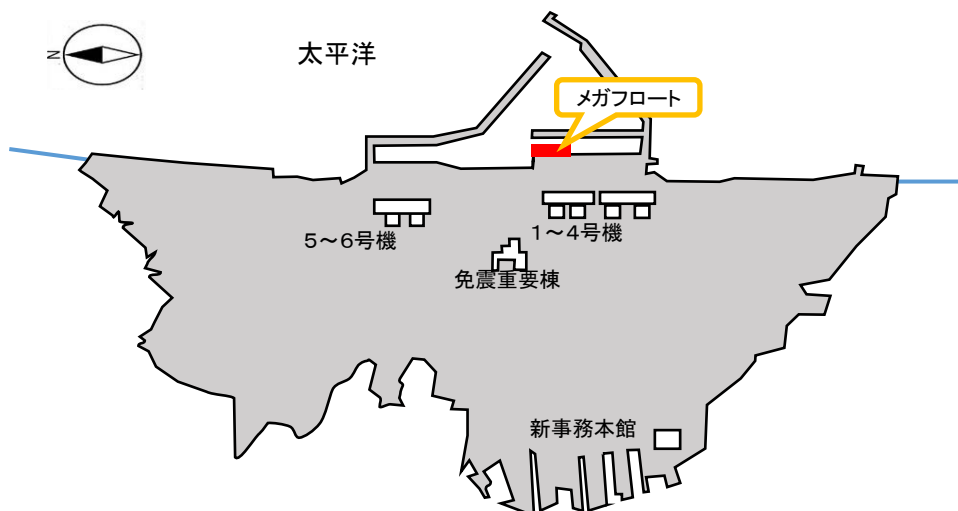


図1 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
仮棧橋の設置状況  
(メガフロート北側)



(写真2)  
汚濁防止フェンス設置作業の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
