

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年 4月1日（水）

2 確認箇所

1 / 2号機共用排気筒（1 / 2号機開閉所前から確認）

3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況

4 確認結果の概要


1 / 2号機共用排気筒解体工事は、3月22日に16ブロック目の解体が完了し、3月23日から17ブロック目の解体作業が開始されていることから、作業の進捗状況を確認した。

なお、17ブロック目は、筒身と鉄塔が一括解体されるブロックであり、3月31日までに、筒身50%の切断及び鉄塔斜材の切断が完了している。

- ・現地確認時（10時45分頃）には、鉄塔解体装置が筒身頂部に設置されており、支柱切断装置が支柱材の切断位置にセットされていた。（写真1）
- ・東京電力によると、16時20分頃まで支柱材の切断作業を行った後、天気予報で20時頃からの強風が予報されていたため、鉄塔解体装置を吊り下ろしたとのことであった。



（写真1-1）

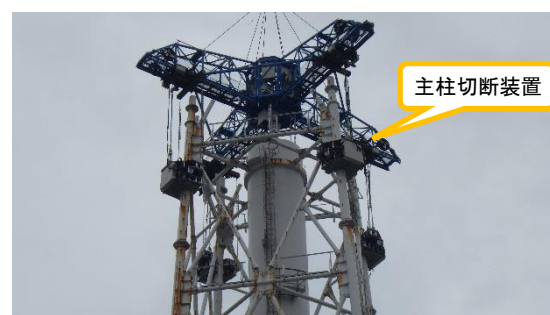

（写真1-2）

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
