



福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年12月23日（水）
- 2 確認箇所
H9タンクエリア、H9西タンクエリア
- 3 確認項目
H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要
前回（11月26日）に引き続き、H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。（図1）
 - ・H9タンクエリアではフランジ型タンク全5基の解体が完了しており（前回確認時：解体完了1基）、現地確認時には、H9西タンクエリアにおいて、フランジ型タンク全7基中の1基目（B1タンク）の1段目側板の解体作業が行われていた。（図2、写真1）
 - ・H9タンクエリア南側の濃縮処理水移送ポンプ室及びポンプ、配管、ケーブル等の撤去は完了しており、撤去されたケーブル類が保管されていた。（写真2）

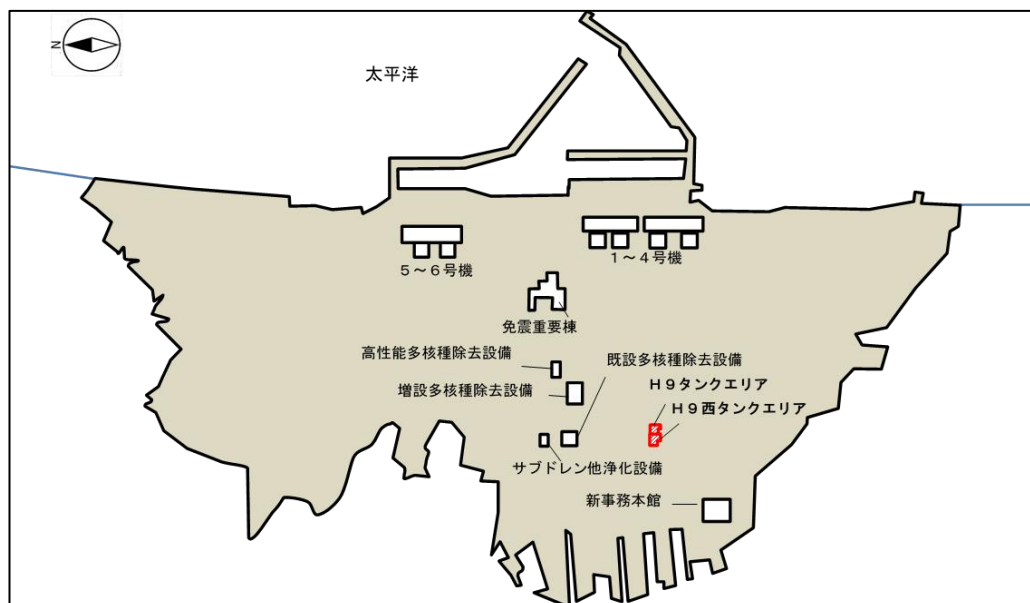

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図

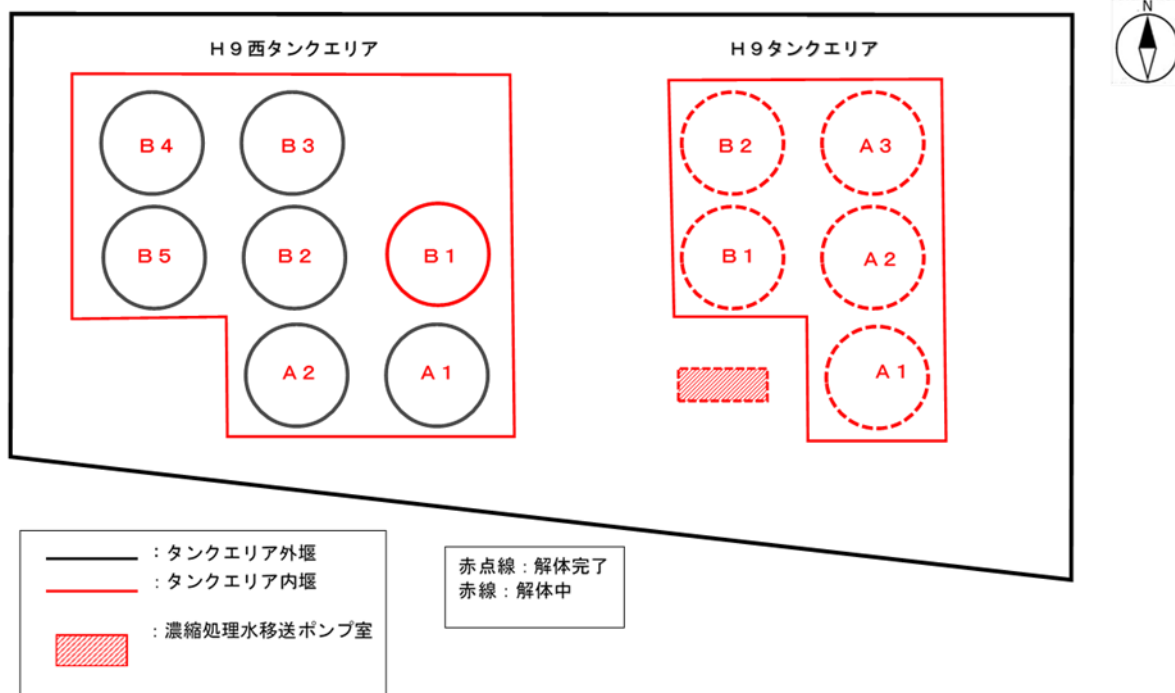

(図2) H9、H9西タンクエリア概略配置図



(写真1-1)
 H9タンクエリアの状況
 (北側から撮影)



(写真1-2)
 H9西タンクエリアB1タンクの解体作業の状況① (北側から撮影)



(写真1-3)
H9西タンクエリアB 1タンクの解体作業の状況② (南側から撮影)



(写真2)
H9タンクエリア南側の状況
(南西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
