

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和4年9月15日（木）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定地

3 確認項目


固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設に係る地盤改良工事の状況

4 確認結果の概要

廃炉作業で発生する瓦礫等の屋外一時保管を解消するため、固体廃棄物貯蔵庫第10棟を建設する工事が進められていることから、現場の状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和4年1月31日](#)）

なお、昨年12月時点で東京電力は、今年1月より固体廃棄物貯蔵庫第10棟の地盤改良工事に着工する予定としていたが、着工が遅れていた。

- ・固体廃棄物貯蔵庫第10棟はA棟、B棟、C棟の3棟からなり、現場ではA棟の建設予定地で地盤改良工事に向けた準備が進められており、地盤改良用重機の調整が行われていた。（写真1）（写真2）
- ・B棟建設予定付近では、重機搬入のための準備として砂利敷きが行われていた。
- ・現場の東側（C棟建設予定地）には廃棄物が仮置きされており、コンテナ収納に向けた作業が行われていた。（写真3）

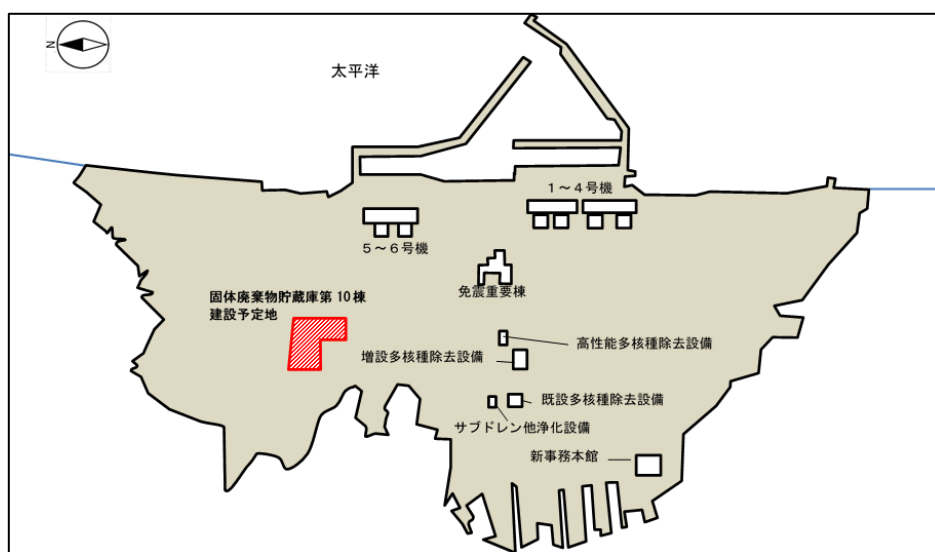

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
A棟建設予定値の状況



(写真2)
地盤改良用重機の調整状況



(写真3)
廃棄物集積の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
