


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和2年10月20日（火）
- 2 確認箇所  
2号機原子炉建屋5階（遠隔操作室から確認）
- 3 確認項目  
2号機原子炉建屋オペレーションフロア内の残置物移動・片付け状況

### 4 確認結果の概要

2号機原子炉建屋使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、2号機原子炉建屋5階オペレーションフロア（以下、「オペフロ」という。）では、平成30年8月から、遠隔操作重機等を用いて、新設する燃料取扱設備の設置等に干渉する残置物等の移動・片付け作業が実施されている。片付けられた残置物の一部は収納コンテナで保管されていたが、本年9月よりオペフロから搬出し、固体廃棄物貯蔵庫へ運搬する作業が実施されていることから状況を確認した。（図1）

- ・残置物を収納した収納コンテナは44基あり、原子炉建屋西側に設置された構台上の前室内で遠隔操作重機を用いて収納コンテナ2基を搬出用コンテナ1基に収納する作業が実施されていた。（写真1）
- ・東京電力によると、既に搬出用コンテナ18基を固体廃棄物貯蔵庫へ運搬しており、予定どおり、本年11月中に作業が完了する見込みとのことであった。

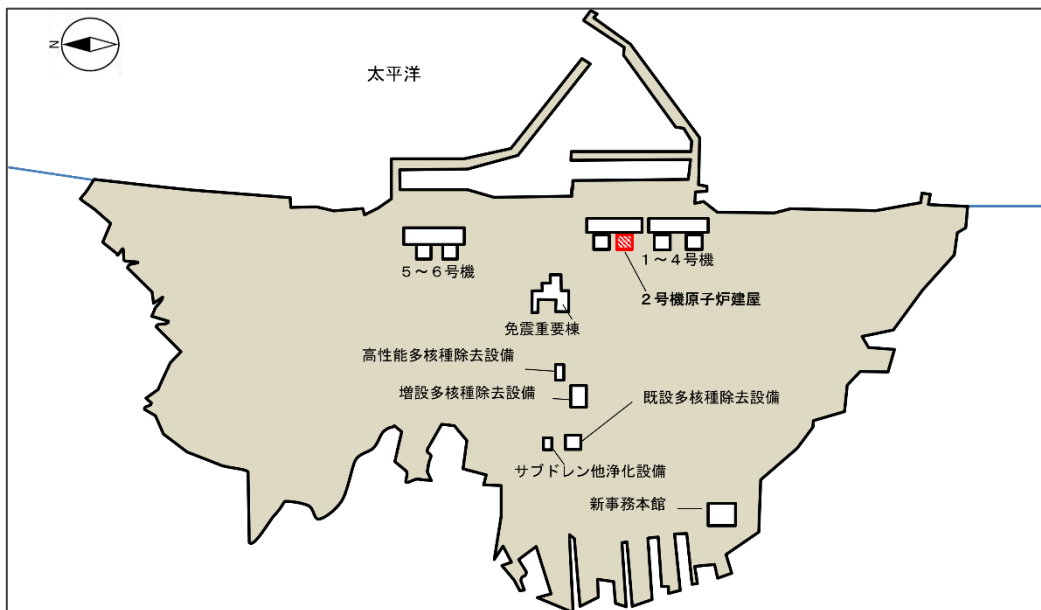

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
遠隔操作室での重機の操作状況

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
