

## なんこみなみ 復興公営住宅・南湖南団地造成工事の進捗状況

7月26日現在、造成工事全体の75%の工事が完成しています。これまでに、盛土工事、管路工事、側溝布設工事などが進められており、7月には道路工事が始まりました。

また、宅地などの法面に雑草が生えにくくするよう、防草マットを布設しています。



道路の路盤工事



法面の防草マット布設工事



宅地の整地工事

8月中旬から造成工事と並行して、福島優良住宅建設協会（代表事業者：（株）オオバ工務店）により、住宅工事を行う予定です。

工事車両の通行など、御迷惑をおかけしておりますが、引き続き工事への御協力をお願いします。

### 担当者紹介コーナー

現場は日影がなく大変ですが、熱中症に気をつけて頑張っています。



株式会社菊地測量設計 小林 政雄さん  
（工事監理）


【現在の状況】



【工事の状況】



道路の路盤工事

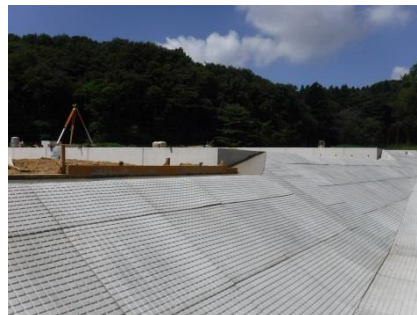

宅地の法面工事



宅地の整地工事

【工程表】

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
盛土工		盛土材搬入・盛土							
管路工	上水道・下水道布設								
法面工		段差・法面整形							
構造物工	集水樹・側溝等の据付								
道路工				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
※ 住宅工事					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■				
通行止期間	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

※通行規制の区間等については、[ニュースレター第2号](#)をご覧ください。

工事概要

開発面積：9,517.44 m<sup>2</sup>

宅地の造成、区画内道路やインフラの整備を行います。

施工業者：株式会社松本工務店

工期：平成28年2月3日～平成28年11月28日
