


# 福島駅前通り工事進捗状況

## 事業概要


路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内  
 延長 L=230m  
 幅員 W=約6.0(20.0)m  
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。  
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図



## 現場状況写真

①平成29年2月1日現在

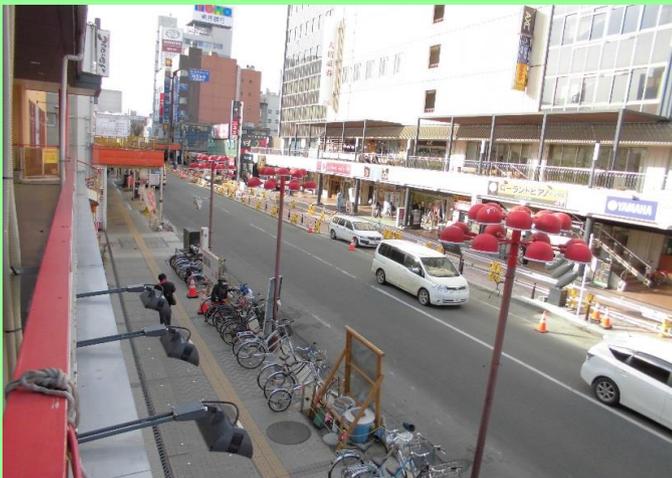

平成29年3月末現在



南4ブロックの車道側溝の設置を行っています。

②南4ブロック工事着手前(平成29年2月1日撮影)



平成29年3月末現在



南4ブロックの車道側溝の設置を行っています。

## 4月の施工予定

南4ブロックの歩道ブロック設置、南3ブロックの車道側溝設置を行います。
