


福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内
 延長 L=230m
 幅員 W=車線部6.0m(全幅20.0m)
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図




現場状況写真

①平成29年2月1日現在



平成29年7月末現在

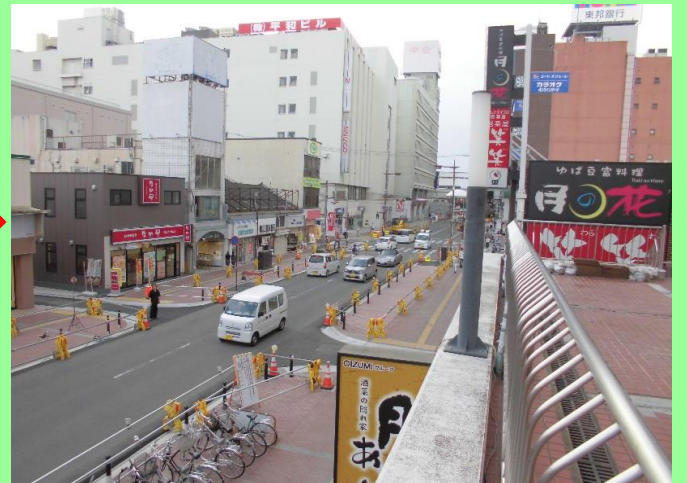

南2ブロックの歩道工事が完了し、南1ブロックの一部において、歩道ブロックの設置を行っています。

②北2ブロック工事着手前(平成29年2月28日撮影)



平成29年7月末現在



北2、南1ブロックのアーケードが撤去され、北2ブロックの車道側溝の設置に着手しました。

8月の施工予定

北2ブロックの車道側溝設置及び歩道側溝設置工事、市道交差点から国道13号までの区間の車道工事を行います。
