

棚倉町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)



平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)

進捗数	92
発注数	92
計画数	92

(参考)全体計画数=147戸

公共施設等(施設数)

進捗数	12
発注数	12
計画数	12

(参考)全体計画数=14施設

道路(km)

進捗数	0
発注数	0
計画数	0

(参考)全体計画数=0.7 km

森林(生活圏)(ha)

進捗数	1.0
発注数	1.0
計画数	1.0

(参考)全体計画数=調整中



山本公園駐車場除染状況



社川小学校除染状況

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み 2ヶ所
搬入中 1ヶ所
搬入前 4ヶ所




山本仮置場全景



高内仮置場全景

棚倉町の除染情報(棚倉町のホームページにリンク)

- ・ 棚倉町除染実施計画
<http://www.town.tanagura.fukushima.jp/view.rbz?cd=617>
- ・ 放射能関連情報
<http://www.town.tanagura.fukushima.jp/info.rbz?nd=319&ik=1&pnp=319>

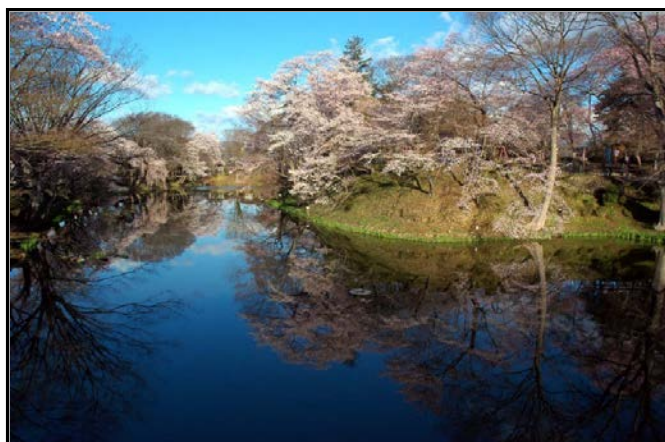

棚倉城址
