

津波被災地(帰還困難区域を除く)における復旧・復興事業の完了見通しについて

平成31年2月8日 農林水産部・土木部

1. 趣旨

- 津波被災地（帰還困難区域を除く）における公共土木施設等の復旧・復興事業について、災害復旧事業や津波被災地の復興まちづくりなど事業の進捗状況を県民に広くお知らせするため、平成27年度末（H28.2.8）に事業箇所ごとに完了見通しを公表した。
- 予定より早く完了できる箇所や他事業との調整等により工程に変更が生じた箇所など毎年度の成果とともに年度末に事業の進捗状況等を改めて公表するものとしている。（前回公表は、平成29年度末（H30.2.7））

2. 平成30年度の成果

- 平成30年度は、年度末までに完了するものを含め46箇所の工区が完了となり、概ね計画通り進捗している。
- 津波被災地における各種事業が着実に進捗し、総合的な防災力の向上が図られるとともに海水浴場の再開や営農再開など、地域の復興支援に寄与。
- 各事業毎の平成30年度末完了予定箇所は下記のとおり。

	事業内容	H30完了数
河川	【南相馬市】鶴江川、小高川 【浪江町】高瀬川 【富岡町】紅葉川 【いわき市】鮫川、鯉田川	6
海岸	【相馬市】原釜 【南相馬市】烏崎、小浜零、村上（農）、井田川 【浪江町】請戸中浜、中浜、浪江中浜、棚塩（建） 【双葉町】郡山中野 【富岡町】仏浜 【楢葉町】波倉、繁岡、井出 【いわき市】四倉、夏井、豊間（漁）、岩間佐棟	18
排水機場	【南相馬市】金沢・金沢第二、浪佐、村上、村上第二、福浦南部 【楢葉町】木戸川	6
港湾・漁港	【相馬市】松川浦漁港 【南相馬市】真野川漁港 【富岡町】富岡漁港 【いわき市】四倉漁港	4
道路	【南相馬市】広野小高線	1
津波被災地道路	【新地町】相馬互理線（新地）、新地停車場釣師線（釣師） 【相馬市】相馬互理線（原釜尾浜） 【いわき市】【街路】平整城線（小名浜）	4
防災緑地	【新地町】浜浜地区防災緑地 【いわき市】四倉地区防災緑地、豊間地区防災緑地、永崎地区防災緑地、岩間地区防災緑地	5
海岸防災林	-	-
治山施設	【相馬市】屋小屋地区護岸工、大洲地区護岸工	2
合計		46箇所

※青太字箇所の整備概要を、右頁に記載した。

※海岸の（ ）は、同名の海岸があるなど管理者がわかるように、建設海岸を（建）、漁港海岸を（漁）、農地海岸を（農）と記載した。

3. 平成30年度に完了（予定含む）する主な工区

らちはま そうまわたり しんちていしやじょうつるし
【浜浜地区防災緑地、相馬互理線、新地停車場釣師線（新地町）】※計画通り完了
新地町沿岸部の整備完了により、新地駅周辺の復興まちづくりを支援。



かねざわ・かねざわだいに しぶさ むらかみ むらかみだいに ふくらなんぶ
【金沢・金沢第二、浪佐、村上、村上第二、福浦南部排水機場（南相馬市）】※計画通り完了
南相馬市の排水機場5機の完了により、営農再開を支援。



よつくら よつくら よつくら
【四倉地区防災緑地・四倉地区海岸・四倉漁港（いわき市）】※前倒し完了
四倉地区（いわき市）において、津波に備えた多重防御（海岸堤防、防災緑地）及び漁港を前倒して完成させた。（四倉地区防災緑地については、1年前倒して完成。）




4. 今後の進捗見通し(概況)

【市町村別の進捗見通し】

- H29で全事業完了 : 広野町
- H31で全事業完了予定 : 檜葉町、いわき市
- H32で全事業完了予定 : 新地町、相馬市、南相馬市、双葉町、富岡町

【年度別の進捗見通し】

- **平成31年度**
 - 原釜・尾浜地区、久之浜地区防災緑地の2地区が完了し、防災緑地(10地区)が全て完了予定。
 - 南川原地区治山施設が完了し、治山施設(10地区)が全て完了予定。
- **平成32年度**
 - 河川(31箇所)、海岸(86箇所)、漁港・港湾(15箇所)が全て完了予定。
 - 道路(304箇所)が全て完了予定。
 - 津波被災地道路が全て(21箇所)が完了予定。
 - 排水機場(38箇所)が全て完了予定。

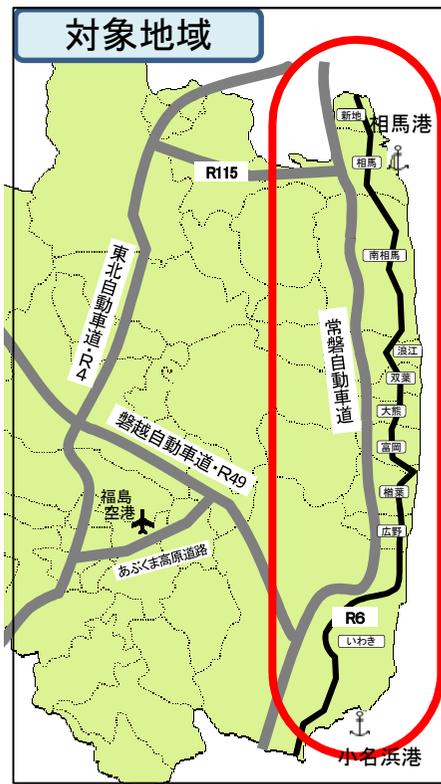

整備後の成果写真



【松川浦地区】
H29に完成した市道大洲松川線(県代行工事)において、海岸ウォーキングが開催されるなど整備後の活用が図られています。



【井田川地区海岸】
H30の井田川地区海岸が完成。引き続き背後の海岸防災林事業を進め、農再開を支援します。

5. 各事業の完了見通し (個別箇所の見通しは別添資料2のとおり)

対象施設	事業内容	完了年度	事業箇所	事業進捗見通し(箇所・地区・工区数(累計))			
				H29迄	H30迄	H31迄	H32迄
① 河川	被災した河川の堤防を復旧または新たに築造・かさ上げする	(H32) H32	(31) 31	(18) 18	(25) 24	(28) 26	(31) 31
② 海岸	被災した海岸の堤防を復旧または新たに築造・かさ上げ及び消波堤や離岸堤等の復旧をする	(H32) H32	(86) 86	(60) 60	(79) 78	(84) 83	(86) 86
③ 排水機場	被災した排水機場を復旧する。(海岸堤防に隣接し湛水被害を防止するポンプ場や樋門などの復旧)	(H30) H32	(37) 38	(29) 29	(37) 35	37	38
④ 港湾・漁港	被災した港湾及び漁港の防波堤や岸壁等の施設を復旧する	(H32) H32	(15) 15	(10) 10	(14) 14	(14) 14	(15) 15
⑤ 道路	被災した道路を原形に復旧する	(H32) H32	(304) 304	(299) 299	(300) 300	(300) 300	(304) 304
⑥ 津波被災地道路	津波の襲来前に内陸部や高台に速やかに避難するための道路(バイパス・拡幅)を整備する	(H32) H32	(21) 21	(14) 14	(19) 18	(20) 20	(21) 21
⑦ 防災緑地	津波を軽減し、市街地を守るために新たに植樹や盛土を築造する	(H31) H31	(10) 10	(3) 3	(7) 8	(10) 10	
⑧ 海岸防災林	津波や飛砂、強風等から農地を守る防災林を新たに築造する	(H32) H33以降	(9) 9	(1) 1	(1) 1	(3) 3	(9) 8
⑨ 治山施設	被災した治山施設(防潮堤、護岸工、盛土)を復旧する	(H31) H31	(10) 10	(7) 7	(9) 9	(10) 10	
全体			(523)	(441)	(491)	(506)	(523)
完了率			524	441	487	503	523
				(84%) 84%	(94%) 93%	(97%) 96%	(100%) 99%

※津波による被災を受けた、浜通り沿岸部の9市町村(新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、富岡町、檜葉町、広野町、いわき市)内の事業。
 ※帰還困難区域、および内陸部の事業を除く。(帰還困難区域内について新たに災害査定を受けているが、完了見通しについては、他機関との調整等に影響されるため、本表から除外している。参考として下記に事業進捗を記載。)
 ※海岸防災林(浪江町・浪江地区)は、環境省と事業区域内にある仮設焼却施設や仮置き場等の撤去及び工事着手時期を調整中。
 ※排水機場の箇所数について、今年度新たに工事着手(浪江町:棚塩)したことから1箇所追加。
 ※()はH30.2.7時点の数値

平成31年度までに96%、復興・創生期間の最終年度である平成32年度までに概ね完了の予定です。

【参考】帰還困難区域内の事業進捗

○帰還困難区域を除く津波被災地の復旧・復興事業の進捗状況や完了見通しについて、幅広く県民の皆様にご理解いただくことを目的として公表してきましたが、帰還困難区域内の復旧事業も進捗しています。

査定済件数	完了	着手済	H31着手予定
65	44	11	10

※査定済件数は、H30.12.31時点。
 ※査定済工種は、道路、橋梁、河川、海岸。

○今後、帰還困難区域内の復旧・復興事業も幅広く県民の皆様にご理解いただくよう公表を検討してまいります。
