

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 表門2号)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月27日)

堤防本体を復旧する前に堤防
前面に仮堤防を設置しました。
5月末の完成を目標に堤防を
整備しています。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



堤防盛土、小口止完了 張ブロック着手


施工状況 (令和2年5月15日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 四左衛門内)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所




堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月27日)



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月18日撮影)

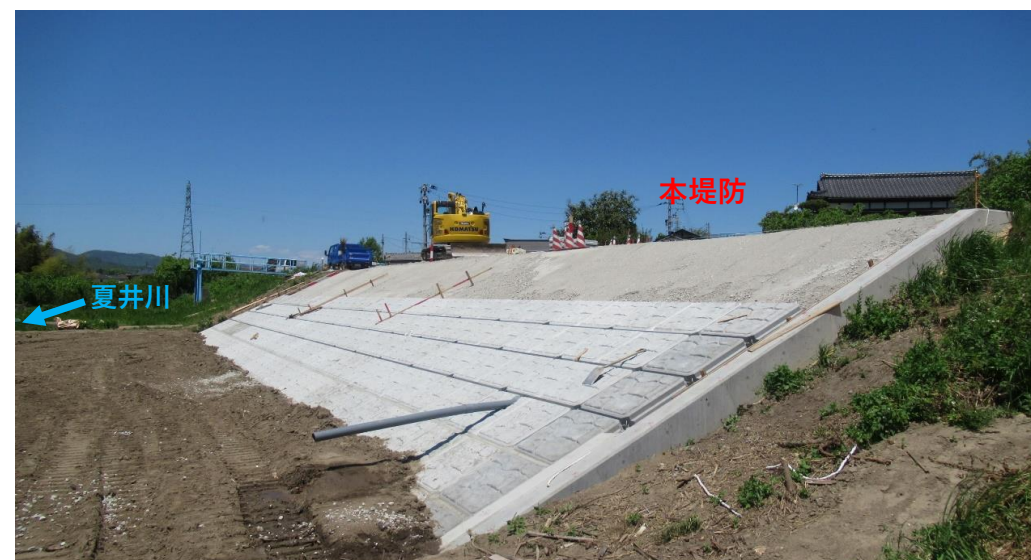

堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年5月15日)

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



川表張りブロック施工中

施工状況（令和2年4月27日）



被災状況（令和元年10月13日撮影）



川表張りブロック完了 川裏鋼矢板打設中


施工状況（令和2年5月15日）

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年4月27日)



5月末の完成を目標に堤防
本体の護岸に着手します。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中 施工状況 (令和2年5月15日)

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 川原)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月27日)



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年5月15日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 緑)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中

施工状況 (令和2年4月30日)



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月14日撮影)



堤防護岸 コンクリート張ブロック施工中

施工状況 (令和2年5月15日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況 (夏井川 東)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月30日)



被災状況 (令和元年10月14日撮影)



堤防本体を復旧する前に堤防前面に仮締切工を設置しました。
5月末の完成を目標に堤防護岸に着手します。



仮締切設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年5月15日)


台風19号により被災した箇所への復旧状況 (好間川 正当)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



仮堤防設置完了、堤防盛土施工中

施工状況 (令和2年4月30日)



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



被災状況 (令和元年10月13日撮影)



川表護岸施工中

施工状況 (令和2年5月14日)

台風19号により被災した箇所への復旧状況（新川 長町）

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



堤防盛土施工中 張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月1日）



被災状況（令和元年10月14日撮影）



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



堤防盛土、張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月15日）

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 戸川原)

令和2年5月18日作成
いわき建設事務所



応急仮工事完了 大型土のう設置

(令和元年11月12日撮影)



被災状況 (令和元年10月22日撮影)



6月から堤防の施工に着手(予定)し、
早期完了を目指します。

地質調査 ポーリング調査

施工状況 (令和2年2月10日)
