

農山村地域復興基盤総合整備事業 片草地区 (福島県南相馬市小高区)



■地区概要

- 事業名 農山村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)
- 総事業費 855百万円
- 受益面積 36.6 ha
- 受益者数 92人
- 事業工期 平成30年度～令和5年度 (予定)
- 負担割合 国75.0%、県13.75%、市11.25%



現地説明会の様子



<現状> 整備前

ほ場整備



<計画> R3.5現在

- ・区画が狭小
※10a (50m×20m)
- ・用排水路の殆どが土水路
- ・区画を拡大
※100a (125m×80m)
- ・用排分離により舗装

ほ場整備を契機に担い手へ農地を集積

<担い手への集積率>

0.8% (0.3ha/37.5ha) → **33.3%** (12.2ha/36.6ha)


■主要工事

整地工	A= 36.6 ha	標準区画125m×80m
道路工	L= 4.8 km	砂利道
用水路工	L= 7.8 km	開水路 (ベンチフリューム等)
排水路工	L= 3.2 km	開水路 (排水フリューム等)
暗渠排水工	A= 29.4 ha	本暗渠29.4ha
客土工	A= - ha	-
付帯工	- 式	-

■工程表

	R1	R2	R3	R4	R5
整地工	→	→	→	→	→
道路工	→	→	→	→	→
用水路工	→	→	→	→	→
排水路工	→	→	→	→	→
暗渠排水工	→	→	→	→	→
客土工	→	→	→	→	→
付帯工	→	→	→	→	→
補完工事等	→	→	→	→	→

■平成30年度・令和元年度における調整等

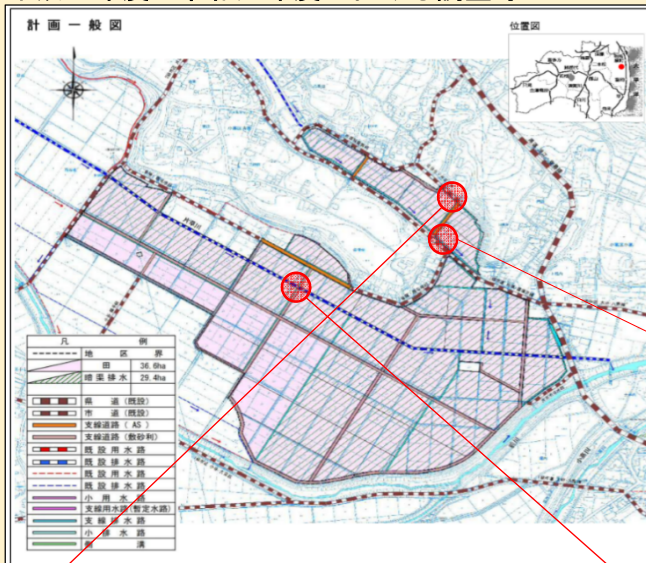

道水路の配置や区割等検討状況




支障物件確認状況

計画から工事へ移行

■令和2年度営農状況・令和3年度工事状況等

R2年度小麦作付け状況

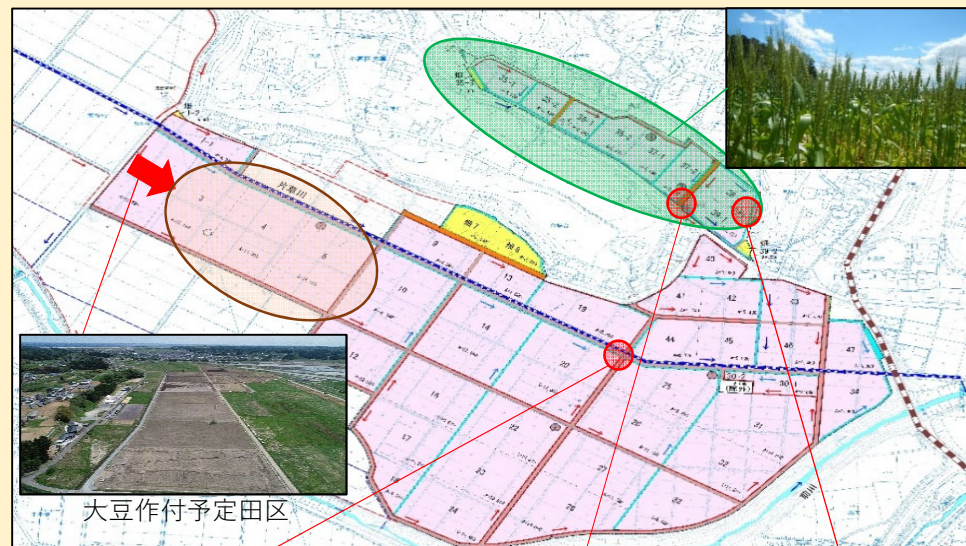

大豆作付け予定田区



農道 (ずり使用) 施工状況



支線排水路施工状況



ふとんかご施工後



地元との現場確認状況



地区境界確認状況



ボーリング調査状況
