

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 8月28日 (火)

2 確認箇所

3号機原子炉建屋オペレーティングフロア

3 確認項目

3号機原子炉建屋オペレーティングフロアの状況

4 確認結果の概要


3号機原子炉建屋オペレーティングフロア（以下、「オペフロ」という。）に設置されている主要設備等の状況を確認した。

（前回確認；平成30年1月30日）


- ・オペフロ西寄りにクレーン、東寄りに燃料取扱機、北西端及び北東端にエリア放射線モニタ（オペフロの空間線量率を測定し、施設、装置等に異常があった場合に早期に作業員に知らせるためのもの）が設置されていた。（写真1）




(写真1-1)



(写真1-2)

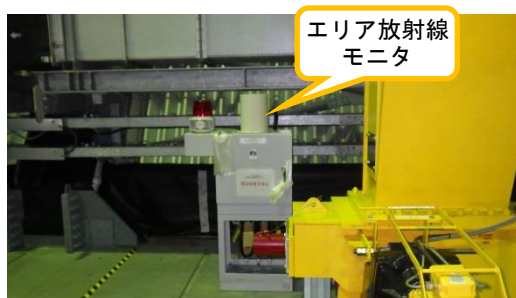

(写真1-3)

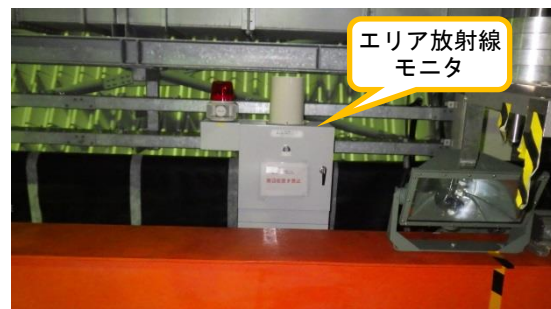

(写真1-4)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。
