

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年4月20日（金）

2 確認箇所

G4南タンクエリア

3 確認項目

G4南タンクエリアの雨水回収タンクの状況

4 確認結果の概要

G4南タンクエリアの雨水回収タンク（B-5）について、設置状況及び当該タンクに敷設している耐圧ホースの漏洩防止対策等の状況を確認した。


- ・当該タンクは、G4タンクエリアの西側に設置されていた。（写真1）
- ・当該タンクに敷設されている内堰内の耐圧ホースの状況を確認したところ、淡水化RO集合ヘッダーへ移送する払出ホース及びG4南タンクエリア集合ヘッダーからの受入ホースが各々1本確認された。（写真2）
- ・当該受入ホースの集合ヘッダー部を確認したところ、集合ヘッダーには6つのフランジ部があったが、閉止板又はビニール養生されており、現在、雨水は受け入れしていなかった。（写真3）
- ・外堰外の淡水化RO集合ヘッダーへ移送する払出ホースの連結部を確認したところ、連結部には、ホース抜け防止対策としてワイヤーが付けられており、漏えい防止対策として連結部廻りにビニールで養生されていることを確認した。（写真4）



（写真1）



(写真 2)

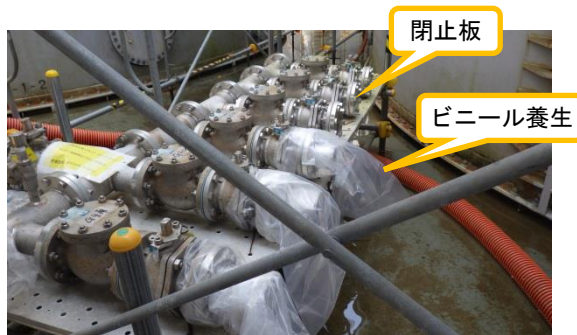

(写真 3)



(写真 4)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。
