


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年11月22日（金）
- 2 確認箇所
5／6号機北側造成地（大型廃棄物保管庫建設予定地）
- 3 確認項目
大型廃棄物保管庫建設工事の状況並びに建設予定地西側仮設休憩所の運用状況
- 4 確認結果の概要

前回（10月1日）に引き続き、敷地北側の造成地において建設が進められている大型廃棄物保管庫^{※1}の建設工事の状況を確認した。また、同箇所の西側に位置する休憩所の運用状況も確認した。（図1）

- ・現場確認時、建屋建設予定箇所の掘削・土砂搬出及び地盤改良施工機の点検作業が行われていた。（写真1）
- ・仮設休憩所は装備脱衣エリア、サーベイエリア、装備着衣エリア、休憩エリアに分かれており、汚染のおそれのない休憩エリアでは食事や水分補給ができるように整備されるとともに、洗面所や喫煙所も設置されていた。なお、休憩所内部は適切に管理する人員が配置されていた。（写真2）

※1 大型廃棄物保管庫：汚染水処理装置（セシウム吸着装置等）から発生する二次廃棄物（使用済吸着塔）等、大型で重量のある廃棄物を保管する施設

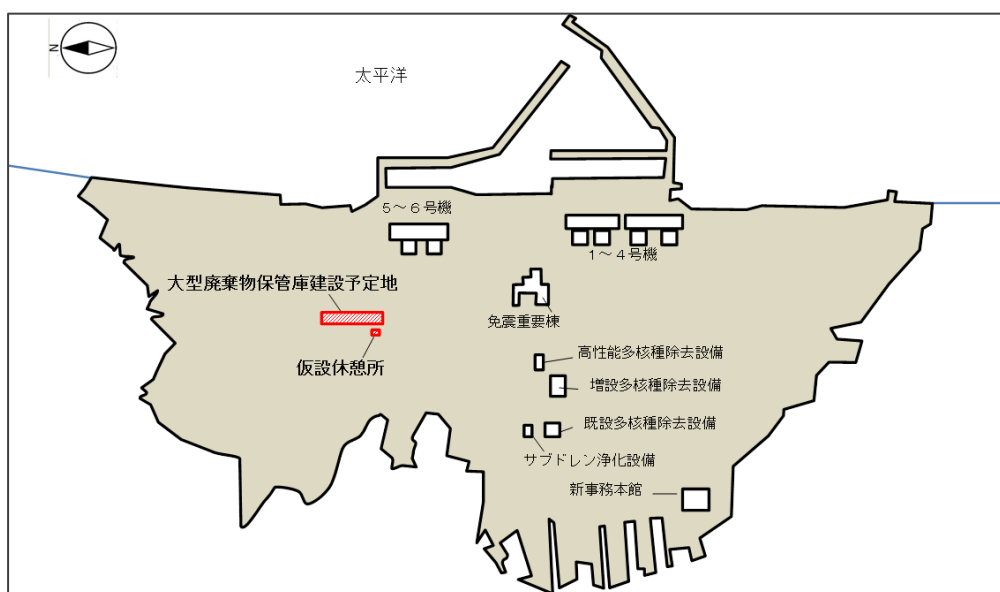

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)
南東側から撮影 (10 月 1 日撮影)



(写真 1 - 2)
南東側から撮影 (11 月 22 日撮影)



(写真 2 - 1)
休憩所外観



(写真 2 - 2)
装備脱衣エリア



(写真 2 - 3)
サーベイエリア



(写真 2 - 4)
装備着衣エリア



(写真 2 - 5)
休憩エリア

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
