

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年10月26日（月）

2 確認箇所

- ・ 1/2号機共用排気筒解体ブロック仮置きヤード（2.5m盤）
- ・ 定検用機材倉庫B


3 確認項目

1/2号機共用排気筒減容作業の状況

4 確認結果の概要

8月に開始された1/2号機共用排気筒減容作業について、今回は排気筒解体ブロックを仮置きヤードから減容作業を行う定検用機材倉庫Bに運搬する一連の作業を確認した。（図1）（前回確認日：9月14日）

- ・ 解体ブロックは、架台に固定された状態で専用の治具を用いてクレーンで吊り上げられ、トラックの荷台に積載された。（写真1）
- ・ 積載後、架台をチェーン荷締機で荷台に固縛するとともに、解体ブロック本体の荷締ベルトによる固縛状況を確認したうえで、定検用機材倉庫Bまで運搬していた。（写真2）
- ・ 定検用機材倉庫Bに運び込まれた解体ブロックは、天井クレーンを使用して、架台に固定された状態でトラックの荷台から降ろされた。（写真3）
- ・ 本日は、2基の解体ブロックが特にトラブルなく定検用機材倉庫Bに搬入された。

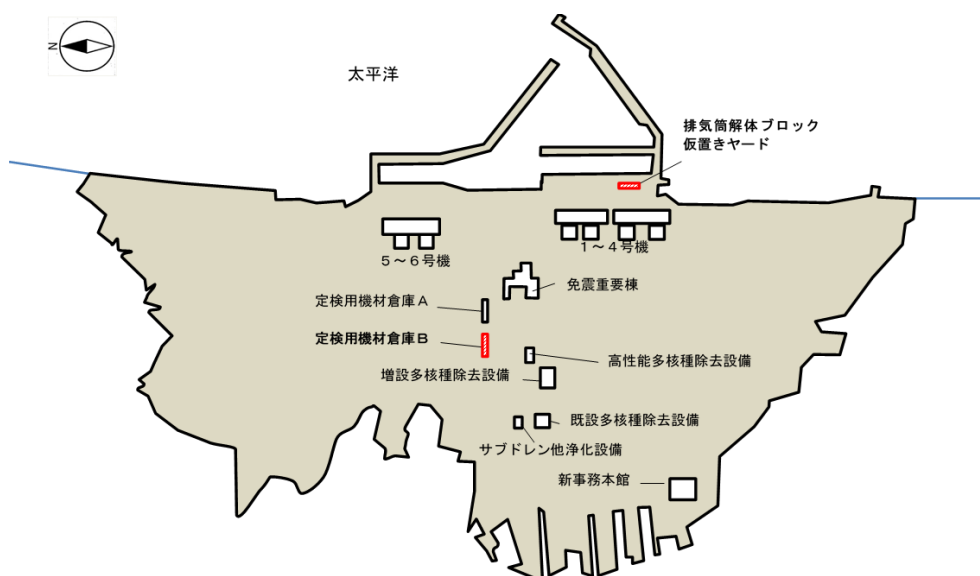

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
解体ブロックの吊り上げ状況



(写真2-1)
解体ブロックの固縛確認状況



(写真2-2)
定検用機材倉庫Bへの運搬状況



(写真3)
定検用機材倉庫Bでの荷下ろし状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
