

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年4月20日（火）

2 確認箇所

H9及びH9西タンクエリア


3 確認項目

H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンクの解体状況

4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所では、ボルト締めフランジ型タンクの解体を順次進めており、前回（令和3年1月29日）に引き続き、H9及びH9西タンクエリアの作業状況を確認した。（図1）

- ・前回までに全12基のタンクうち10基の解体完了を確認していたが、今回は全ての解体完了を確認した。（写真1）
- ・堰の解体工事が開始されており、内堰が概ね解体完了していたほか、床面のコンクリートの撤去も進められていた。また、堰内では重機によりコンクリート片の小割作業が行われていた。（写真2）
- ・周辺では作業員が小割されたコンクリート片に混入している鉄筋等を手作業で回収していた。（写真3）

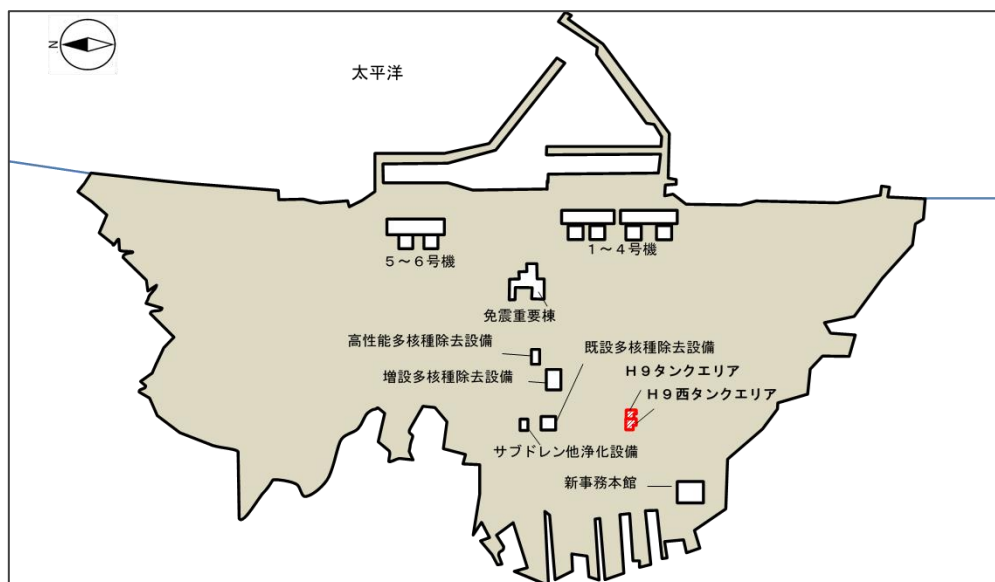

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)
前回の状況
(令和 3 年 1 月 29 日撮影)



(写真 1 - 2)
今回の状況
(令和 3 年 4 月 20 日撮影)



(写真 2 - 1)
堰内の状況



(写真 2 - 2)
コンクリートの小割作業の状況



(写真 3)
鉄筋等回収作業の状況

5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
