

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年2月17日（金）

2 確認箇所

瓦礫類一時保管エリアBB設置予定箇所（第二土捨て場）


3 確認項目

追設瓦礫類一時保管エリア予定箇所の状況

4 確認結果の概要

廃棄物管理の適正化のため、仮設集積場所の瓦礫類一時保管エリアへの変更や使用済保護衣等一時保管エリアの瓦礫類一時保管エリアへの転用等の計画が進められている。今回は、瓦礫類一時保管エリアBBへの変更を予定している仮設集積場所の状況を確認した。（図1）（前回確認日：令和4年5月31日）

- ・確認箇所の西側には鉄板が敷かれており、6 m³コンテナが3段積みで仮置きされていた。（写真1）
- ・中央部には1 m³コンテナが4段積みで仮置きされており、中央部から南東側にかけては、6 m³コンテナが2～3段積みで仮置きされている他、単管パイプのバリケード内にガレキが野積みされていた。（写真2）
- ・東京電力では、一時保管待ち仮設集積の解消に向けた計画を策定しており、今年度中に仮設集積の最小化を達成するとしている。

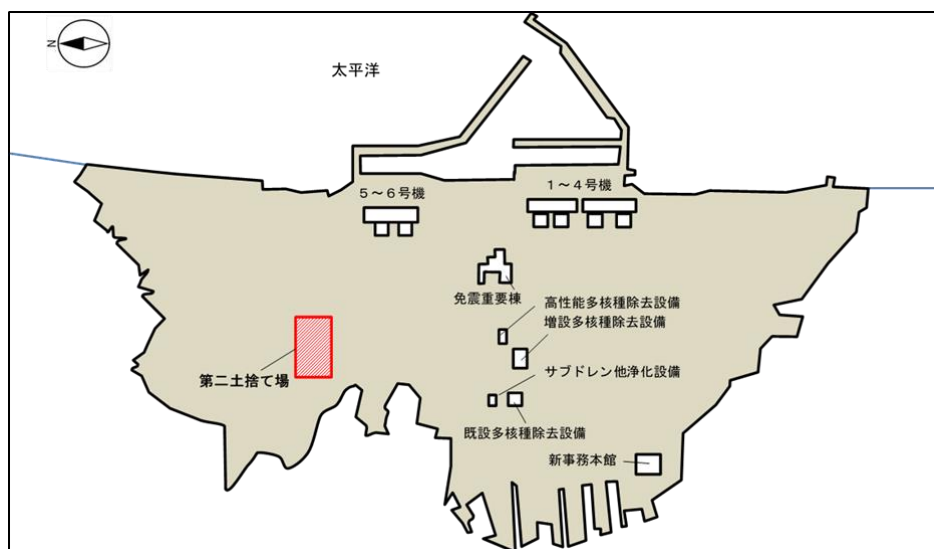

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
仮設集積場所の西側の状況
(北西側から撮影)



(写真2-1)
仮設集積場所の中央部の状況
(中央部から撮影)



(写真2-2)
仮設集積場所の東側の状況
(北側から撮影)



(写真2-3)
仮設集積場所の南側の状況
(中央部から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
