

# 福島第一原子力発電所現地確認報告書

## 1 確認日

令和6年12月12日（木）

## 2 確認箇所

No. 1 重油タンク（1号機タービン建屋北側）（図1）

## 3 確認項目


2. 5m盤サブドレン集水設備機能移転工事に係るNo. 1 重油タンク解体撤去後の状況確認

## 4 確認結果の概要

津波対策の一環として現在T.P. 2.5m盤に設置されている1～4号サブドレン他集水設備を高台（33.5m盤）に機能移転する工事が進められている。これに関連し、T.P. 8.5m盤1号機タービン建屋北側にある重油タンクを解体、その跡地に移送用中継タンクを設置する計画となっている。

今回は、前回に引き続き、No. 1 重油タンクの解体作業の進捗状況を確認した。（前回確認：[令和5年7月19日](#)）

- ・ 前回の確認においては、No. 1 重油タンクは全て解体され、現場には足場を解体した部材が保管されていたが、今回の確認では部材の撤去がさらに進んだ状況が確認された。（写真1）
- ・ 跡地には、移送用中継タンクが設置される予定となっているが、現時点においては、当該工事の進捗は確認されなかった。また、前回確認時に見られた解体物保管エリアは解消され、底盤や弁等の解体物の保管は、確認されなかった。（写真2）

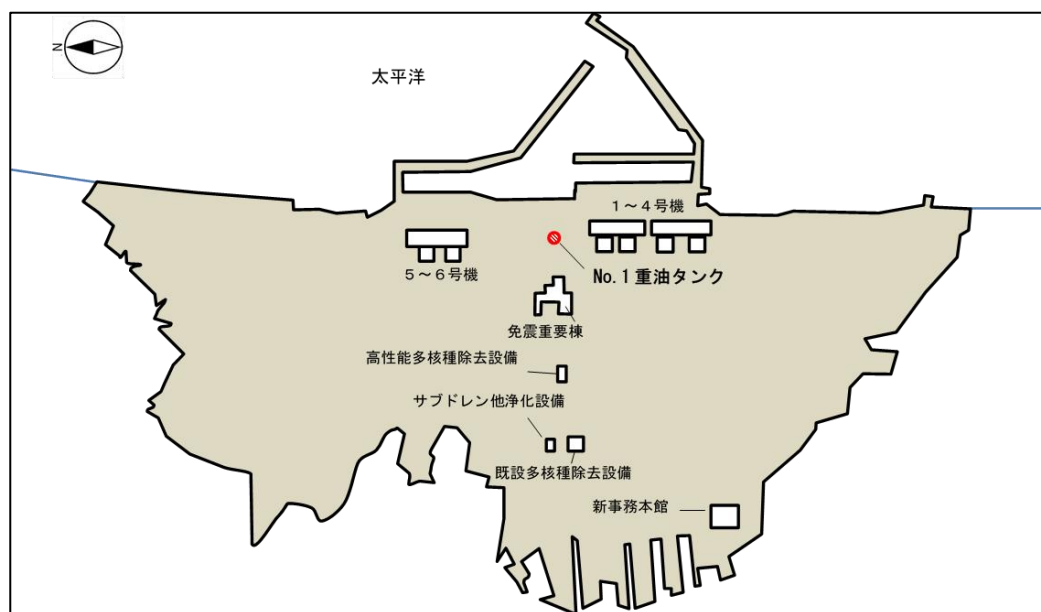

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1)  
No. 1 重油タンク跡地の状況



(写真 2-1)  
No. 1 重油タンク解体物保管エリアの  
状況①



(写真 2-2)  
No. 1 重油タンク解体物保管エリアの  
状況②

## 5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
